
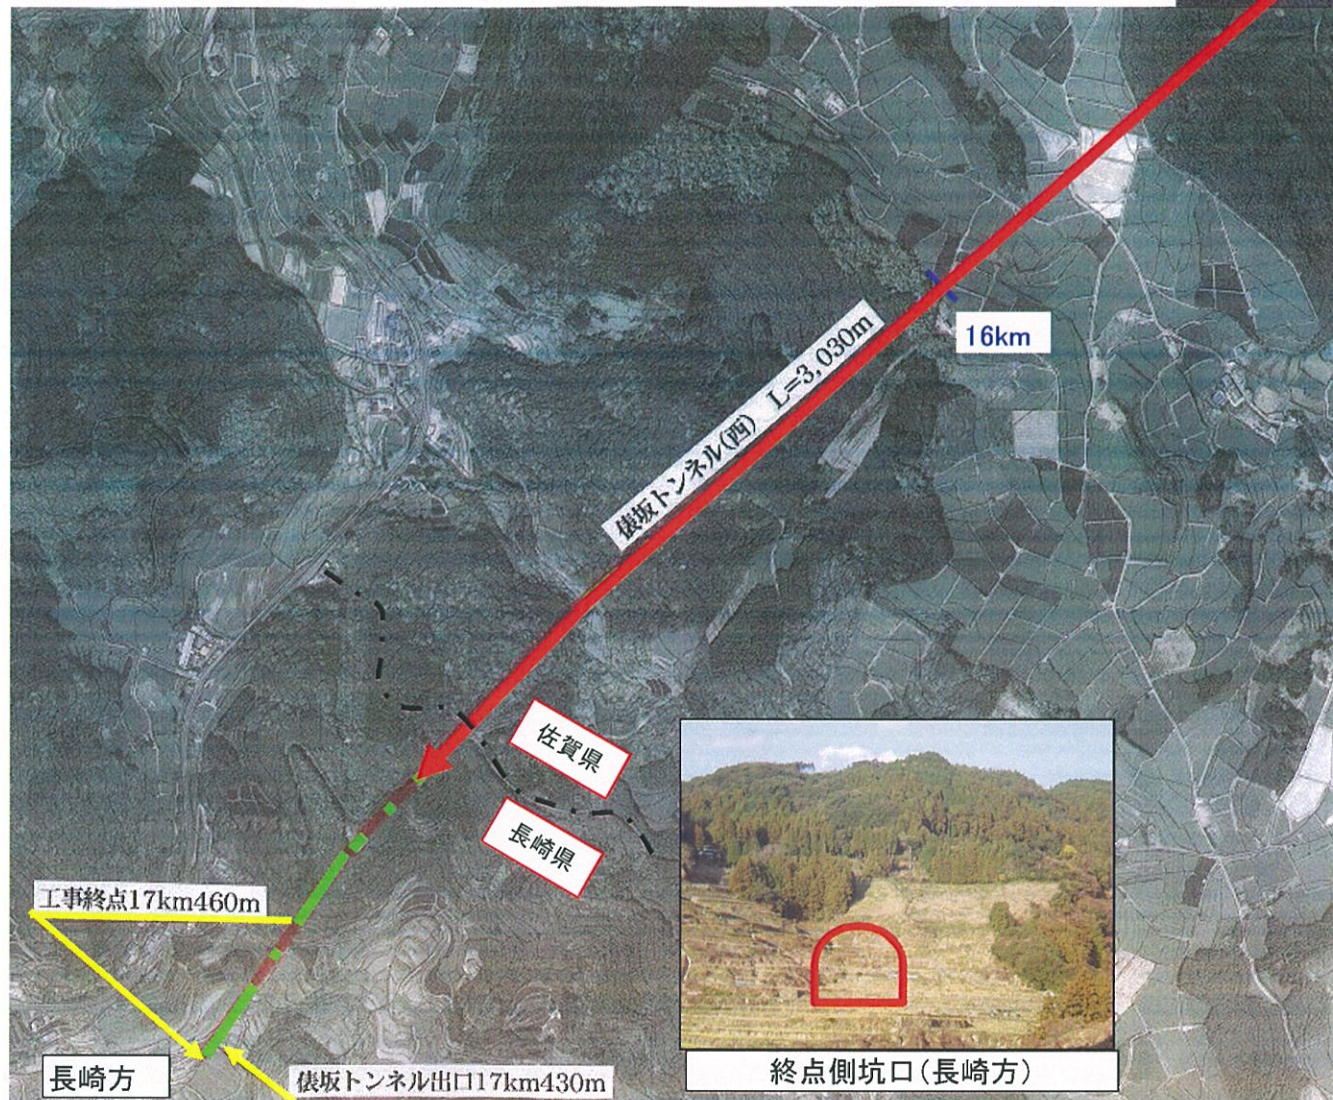


俵坂トンネル(西)進捗状況 2014年 3月5日現在

■ 施工完了区間

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
斜路				
トンネル掘削	m	318	318	100
本坑				
トンネル掘削	m	3,030	2,528.0	83.4
インパットコンクリート	m	3,030	1,911.0	63.1
覆工コンクリート	m	3,030	1,711.5	56.5

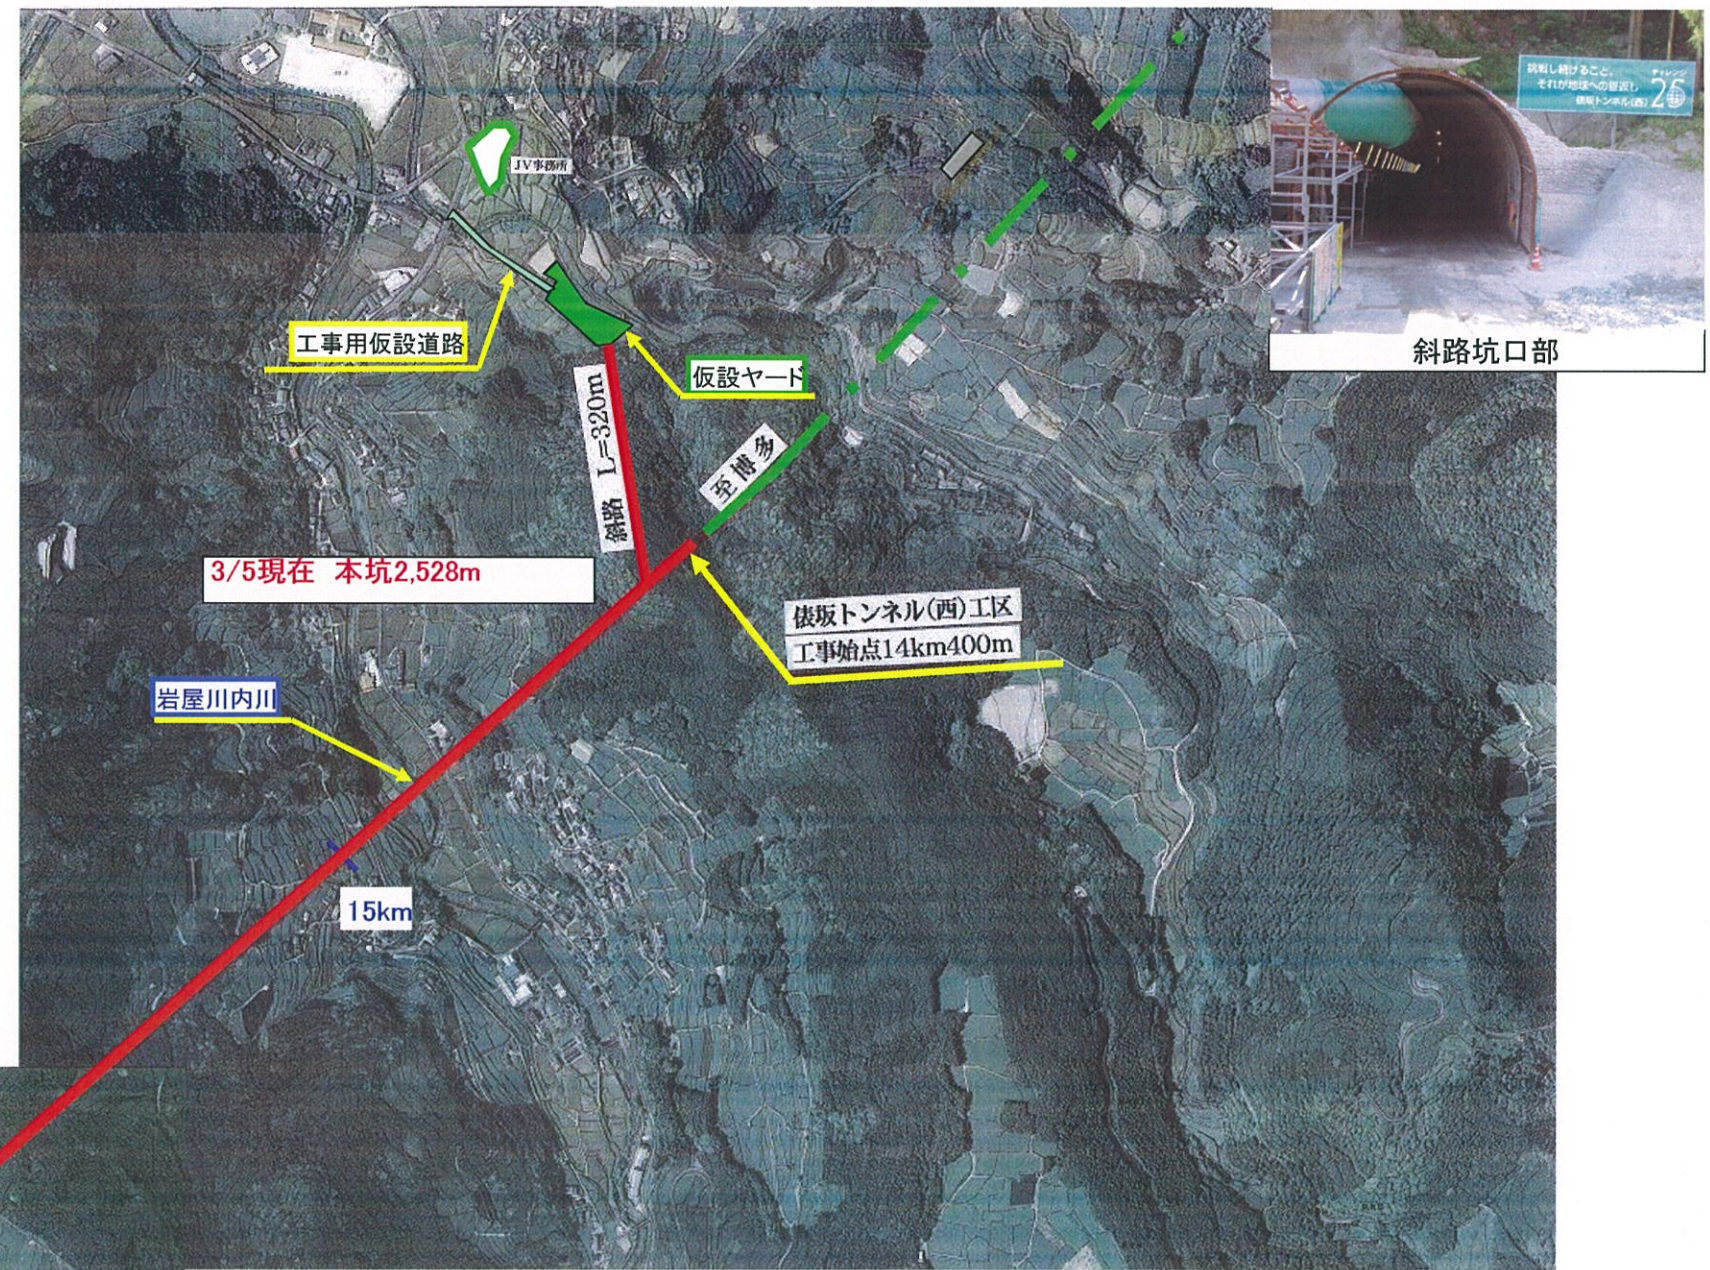

10Jによる切削状況



俵坂トンネル出口 仮橋
